
MINISTERIO DA FAZENDA

DIRETORIA DO DOMINIO DA UNIÃO

SERVIÇO REGIONAL EM MINAS GERAIS

Campo Experimental de Café nos Logares denominados "Palestina e Chacara". Municipio de Machado.

Escala 1.1000

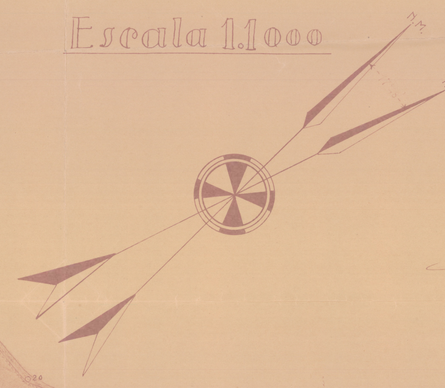

Visto
Chefe do S. Regional

Área
369.846,m² 2974

Calculo das Coordenadas

Vert	Angulos	Distancia	Azimutes	Abcis.as Absol.as	Ord.as Absol.as
0		20.800	83°45 SE	1000.000	1000.000
1	37°34'	57.150	46°11 NW	1020.683	997.733
2	220°00'	20.800	6°11 NW	979.464	1037.294
3	197°45'	291.000	11°34 NE	977.231	1057.970
4	194°15'	30.000	22°49 NE	1035.472	1342.042
5	233°30'	133.000	76°19 NE	1047.115	1369.697
6	149°30'	80.000	45°49 NE	1176.382	1401.136
7	263°00'	75.000	51°11 SE	1233.777	1456.883
8	127°00'	71.000	75°49 NE	1292.238	1409.861
9	199°00'	37.000	85°11 SE	1361.096	1427.249
10	201°00'	46.000	64°11 SE	1397.977	1422.137
11	156°00'	60.000	88°11 SE	1493.997	1406.712
12	195°00'	76.000	66°49 NE	1493.986	1404.802
13	66°00'	344.631	47°11 NW	1560.705	1443.137
14	188°30'	78.324	38°41 NW	1307.509	1667.320
15	174°17'	58.559	44°24 NW	1258.580	1728.450
16	177°30'	27.150	46°54 NW	1217.628	1770.281
17	89°25'	41.300	42°31'30	1197.913	1788.828
18	184°28'	31.900	46°39'30	1163.915	1758.382
19	200°42'	49.600	67°41'30	1146.601	1736.616
20	205°30'	26.500	86°49 NW	1100.732	1717.775
21	165°10'	60.000	78°21'30	1074.682	1713.246
22	173°00'	38.600	71°21'30	1015.537	1707.120
23	182°30'	37.100	73°51'30	978.976	1694.771
24	176°48'	40.000	70°39'30	943.352	1684.447
25	194°00	32.000	84°39'30	905.625	1671.188
26	168°00	20.000	72°39'30	873.775	1668.200
27	193°00	65.900	85°39'30	854.691	1665.233
28	173°00'	44.000	78°39'30	789.002	1653.226
29	175°00'	48.000	73°39'30	745.877	1645.560
30	170°30'	74.000	66°09'30	699.833	1635.042
31	110°30'	32.000	5°21 SE	633.261	1602.767
32	261°30'	172.288	76°09'30	636.255	1570.902
33	81°00	52.000	82°51 SE	469.030	1529.637
34	162°30'	177.311	40°21 SE	489.240	1481.771
35	190°33	232.213	29°46'SE	604.099	1346.559
36	176°00'	51.000	33°46 SE	719.461	1144.356
37	141°00'	109.424	72°46 SE	747.823	1108.562
38	182°10'	114.340	64°36 SE	852.370	1070.120
39	171°00'	32.563	66°36 SE	955.700	1021.057
40	213°00'	14.700	33°36 SE	985.595	1008.120
41	90°43'	1.500	56°37 NE	993.735	995.874
42=0	219°38'		83°45 SE	1000.000	1000.000

CIRCULAR Nº 36

	Dias	Diarias	Total
1 Engº Classe H	15	346666	5200$000
3 Trabalhadores	15	18$000	810$000
Preço do material de desenho			70$000
Custo do desenho da Planta	18		600$000
Transporte			60$000
		Total	2:420$000

BELO HORIZONTE, 11 DE JULHO DE 1942

Levantado por: Affonso da Costa Carvalho
Engº Classe H

Desenhado por: Floriano Peixoto de Faria
Desenhista Classe H

LEGENDA

Caminhamento	
Cerca de arame farpado	
Cafezal	
Construção	
Corrego	
Barranco	
Estrada	
Mangue	
Valo	
Grota	
Jardim	

JOÃO FILIPE DE CARVALHO

PASTO

TERRENO DE CULTURA

JOSÉ SATYPO PEREIRA

CAPOEIRÃO

ARQUIVADO SOB O Nº 118-FLS-33V.-L-1
